

合同编号: XCGW2026147

西城区雨污合流制入河排口治理项目
(枣林前街排口流域)
项目建设管理合同

项目名称: 西城区雨污合流制入河排口治理项目(枣林前街排口流域)
项目建设管理

项目甲方: 北京市西城区城市管理委员会

项目乙方: 北京天恒正宇投资发展有限公司

签订日期: 2026年4月15日

签订地点: 北京市西城区

项目建设管理合同

甲方：北京市西城区城市管理委员会

法定代表人：王冰

住所地：北京市西城区北礼士路12号

乙方：北京天恒正宇投资发展有限公司

法定代表人：黄立兴

住所地：北京市西城区旧鼓楼大街甲3号

根据《中华人民共和国民法典》，为保证政府投资建设项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经甲方与乙方协商同意，签订本合同。

一、项目概况

(一)项目名称：西城区雨污合流制入河排口治理项目（枣林前街排口流域）项目建设管理。

建设地点：北京市西城区

(二)项目范围：西城区雨污合流制入河排口治理项目（枣林前街排口流域）建设全过程项目管理工作。

(三)项目建设内容：在枣林前街排口流域进行雨污合流制入河排口治理，包括新建污水管线、混错接改造、增设旋流装置等工作。通过合流制入河排口治理改造，将减少汛期溢流污染，进一步改善河道水体的生态环境，提升流域整体健康水平（以最终版设计图纸内容为准）。

二、项目管理范围和内容

(一)项目管理范围：负责协助甲方进行本项目的项目建设管理（包括项目前期手续，项目的设计管理、采购组织及项目过程中的进度控制、质量控制、安全控制、竣工验收、结算评审、资料收集归档等相关工作），乙方仅在甲方授权范围内以甲方名义落实相关管理工作，不得超越本合同约定的管理权限以甲方名义作出实质性权利许诺或增加第三方义务。

(二)项目管理类型：委托管理实施

(三)管理内容：

1.项目前期阶段

(1) 项目管理策划：根据项目情况特点，分析项目进展重点、难点，确定工作目标，制定项目实施计划，按需配备专业服务团队。

(2) 外部市政协调：协助项目甲方办理图纸设计范围内有关市政、交通、绿化等任务涉及的手续，同时配合甲方取得相关部门的支持。

(3) 基本建设程序管理：协助项目甲方办理立项、投资计划、规划、国土、环境、文物、交通、节能、消防、人防、园林、水务、防雷设计、图纸审查等各项行政审批或许可手续（本工程不涉及的除外）。

(4) 设计管理：协助项目甲方对设计质量、设计进度、设计概算进行限额控制；对设计材料选择、设备选型提出合理化建议；配合甲方组织专家评审；划分设计单位工作界面；协调各专业设计单位的关系。

2.项目施工准备阶段

(1) 招标采购管理：协助项目甲方选择招标代理公司组织项目监理、施工等参建单位的招标工作；参与编制招标文件、设置合同条款；组织合同谈判、签订、备案等。

(2) 建设程序管理：协助项目甲方办理工程开工质量、安全监管部门的备案手续（本工程不涉及的除外）。

(3) 落实施工条件：协助项目甲方办理占道、施工临时用水、临时用电的接驳等手续。

(4) 施工准备工作管理：协助项目甲方组织设计、施工单位进行技术交底和施工图会审。

3.项目施工组织阶段

(1) 质量管理：协助项目甲方组织各参建单位编制初步质量控制实施计划；组织设计方案的质量评审、施工图设计的质量会审；审核监理单位的监理大纲、监理规划、监理细则；检查监理、施工单位质量管理体系；参加对材料、设备进场的检查。

(2) 进度管理：协助项目甲方编制项目总控制进度计划；审核设计进度计划；审核施工单位的施工总进度计划；审核监理单位的进度控制措施；制订项目甲方采购的工作计划；督促并审核各参建单位制订周/月工作计划；督促各参建单位建立进度计划管理体系；负责项目进度计划检查；组织工程例会，检查和落

实进度计划。

(3) 造价管理：协助项目甲方选择造价咨询公司审核招标清单及控制价，并取得相关评审报告；配合甲方完成总包工程招标及合同签订工作；设计变更、洽商的造价管理；暂估价材料、设备的造价管理；索赔费用的造价管理；协助甲方工程款支付管理；配合甲方进行竣工结算审计，取得结算审核报告。

(4) 合同管理：协助项目甲方起草合同文件及其补充协议；审查合同签订对象；参与合同谈判，制定合同谈判方案、策略；协助项目甲方完成合同、补充协议签署工作；检查合同履行情况；收集、整理合同执行中的往来函件；检查、分析、总结合同执行情况；配合甲方解释合同执行中的争议问题；处理合同索赔事件。

(5) 档案管理：协助项目甲方按照工程档案资料管理规程，督促各参建单位收集整理各自工程档案资料，协助项目甲方整理汇编项目甲方的工程档案资料。

(6) 各参建单位的管理：协助项目甲方监督测绘、设计、监理、施工等参建单位履行合同义务；监督各单位人员、设备配备到位情况。

4.项目竣工验收及结算阶段

(1) 协调各单位组织开展中间验收，包括隐蔽工程、分部工程、分项工程、设备调试。

(2) 竣工手续办理：协助项目甲方办理各专项验收手续；组织项目竣工验收。在具备验收条件之日起合理期限内协助甲方验收项目并书面通知乙方；若验收未通过，乙方负责督促相关责任单位在合理期限内完成整改并重新组织验收，但对非因乙方过错导致的质量缺陷不承担修复责任。

(3) 工程结算管理：协助项目甲方组织相关单位编制竣工结算，配合甲方进行竣工结算审计，取得结算审核报告，并配合完成政府审计工作。

三、项目管理目标

项目总投资（暂估）：人民币：¥7360.82 万元（小写）

人民币（大写）：柒仟叁佰陆拾万捌仟贰佰元（不含征收费用，以最终结算为准）

工程质量目标：合格

安全管理目标：不出现重大主体责任事故和公共安全事故。

工期控制目标：严格按照经项目建设主体批准的项目总进度计划及施工合同约定的总工期，确定主要节点控制目标，实现项目按期顺利竣工交付。

廉洁目标：廉洁高效，不发生违规违纪问题。

项目管理期限：从签订项目建设管理合同开始，经前期设计管理及相关手续的配合工作、实施阶段、工程竣工验收、竣工结算评审、直至完成审计为止。因非乙方原因（包括不可抗力、政府主管部门审批延误、资金不到位等）导致上述工作阶段实际持续时间延长的，相应项目管理期限自动顺延，乙方不承担因工期延长产生的责任。

四、项目建设管理费

（一）项目建设管理费

按照《基本建设项目成本管理规定》（财建[2016] 504号）的规定执行，根据项目建议书批复，含税项目建设管理费暂定金额为：人民币：（大写）壹佰零陆万壹仟陆佰叁拾肆元整；（小写）¥1061634.00元。（最终项目建设管理费金额以结算评审结果为准。）

（二）支付方式

1.本合同生效且财政资金到位后 30 个工作日内，甲方向乙方支付项目建设管理费暂定总额的 30%，计人民币 318490.20 元。若因财政资金未按时到位导致甲方未能按约定时间付款的，不视为甲方违约，且乙方不得据此拒绝履行本合同义务。

2.该项目验收通过且财政资金到位后 30 个工作日内，甲方向乙方支付项目建设管理费暂定总额的 40%（即累计支付至项目建设管理费暂定总额的 70%），即支付人民币 424653.60 元。

3.该项目完成竣工结算并结算评审完成，且财政资金到位后 1 个月内，甲方向乙方结清剩余的项目建设管理费。

4.乙方账户信息如下：

户名：北京天恒正宇投资发展有限公司

税号：91110000589072989B

开户银行：北京银行德外支行

银行帐号：01090364700120109099783

五、合同各方的权利

(一) 甲方权利

第一条 甲方有权全面指导、监督、检查项目管理的实施，对违规行为予以纠正。

第二条 甲方有权对因不可抗力事件、法规政策调整、技术规范变更、水文地质变化、使用功能改变等因素引起的设计变更及其投资调整，或施工条件变更造成的投资调整进行备案或审批。

甲方有权对已批复的投资概算中多计、重计、少计和漏计的投资进行调整，有权对施工图预算进行审核。

第三条 甲方有权要求乙方赔偿擅自变更批复的建设内容、规模、标准，致使项目结算投资额超过批复投资额、工期延长、工程质量不合格或者不具备初步设计文件确定的使用功能，而增加的投资额或者所造成的损失。但前述投资额增加或损失非乙方原因导致的除外。

第四条 甲方有权要求乙方更换不称职的项目管理工作人员。

第五条 甲方有权对乙方报请甲方变更的各种事项提出意见。

第六条 甲方有权参加乙方组织召开的项目管理工作例会，了解项目进度，并参与工程验收。

(二) 乙方权利

第一条 乙方根据甲方的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理、实施及协调权：

1. 协助甲方且以甲方名义与选择的项目服务单位签订合同（包括但不限于项目施工承包、监理以及相关的配套服务合同等）。

2. 协助甲方管理各类项目服务单位签订的合同，并按规定申请甲方直接向服务单位支付费用。

3. 进行项目各参与方的协调工作。

4. 提请甲方按本合同约定落实资金。

5. 提请甲方安排其管理人员参加项目运行、维护的技术培训和移交接收工作。

第二条 乙方对甲方提出的本合同约定之外的工作，有权要求甲方追加项目

投资及延长委托工作期限。

第三条 乙方有权按合同约定取得项目建设管理费，有权要求甲方按约定支付相应的项目建设管理费款项。

第四条 乙方不承担向本项目有关的施工单位、专业分包单位等单位支付合同价款或其他费用的责任，也不承担垫资义务，同时也不需要承担因建设主体逾期付款所产生的违约责任或连带责任。除本合同另有明确约定外，乙方在任何情形下均不对项目甲方与第三方之间的债务承担保证、连带责任或以其自有资金先行清偿的义务。

六、合同各方的义务

(一) 甲方义务

第一条 甲方应在5个工作日内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

第二条 甲方应确定一名联系人负责本项目的联络工作。

第三条 甲方应为项目实施提供必要条件：

1. 根据项目批复的建设内容、规模、标准和投资额，提供详细的项目使用需求（或功能配置）报告。

2. 协调与项目建设手续有关的政府部门关系，及时提供或出具办理项目相关手续所需文件，包括但不限于委托文件等，并在该等文件上签章等。

3. 按工程进度同步开展项目开办所需的专业设备、设施、器材等的采购、安装和调试工作，并确保落实。

4. 按照项目管理合同的规定，移交施工作业现场，为项目顺利实施创造条件。

第四条 甲方应负责项目总投资资金的筹措，确保项目开工时资金到位，且按约定根据乙方申请向项目服务单位等相关方及时付款。

第五条 甲方应在15个工作日内对项目的相关技术文件进行会签或者报批，因甲方内部审批流程原因导致的延期不视为甲方违约。

第六条 甲方应参与并配合完成工程验收，并在验收合格后按有关规定办理项目资产接收手续，并及时沟通协调西城区政府投资项目结算主管部门完成结算评审工作。

第七条 在项目实施过程中，甲方不得提出不符合国家规定的变更要求，也不得随意提出功能、内容及标准的变更要求。

（二）乙方义务

第一条 乙方在履行本合同义务期间，应遵守中华人民共和国和北京市有关法律、法规、规章，包括但不限于《政府采购法》、《招标投标法》等相关规定，且应督促项目服务单位遵守项目建设过程中相关法律、法规和规章规定，维护甲方的合法权益。

第二条 乙方不得将项目管理的权利和义务转让、肢解转让、授权第三方行使权利或履行义务。

第三条 乙方应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理团队。

第四条 乙方不得擅自变更项目管理的主要成员（含项目负责人），确需变更的，须经甲方书面同意。

第五条 乙方应按照项目批复的建设规模、内容和标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。

乙方不得在项目实施过程中利用洽商或者补签协议等方式，未经甲方书面同意擅自变更项目建设规模、内容、标准和投资额。因不可抗力事件、政府主管部门要求（包括窗口指导）、法律法规政策调整、技术规范变更、水文地质变化、使用功能改变等因素引起的设计变更及其投资调整，或因施工条件变更造成的投资调整，由乙方书面方式报甲方批准。因前述因素导致工期调整或影响建成后项目实际使用效果的，不属于乙方违约，双方另行协商解决方案。

乙方对项目进度、项目质量或投资控制承担管理责任。但因甲方未在合理期限内对乙方报批事项予以书面确认或否决而影响项目进度、质量或投资控制的，相应责任和增加的费用由甲方承担，乙方不承担违约责任。

第六条 乙方应根据项目进度需要，及时向甲方提出资金使用计划，由甲方筹措落实。

第七条 乙方应在项目移交前，按照有关规定协助甲方及施工方签订保修服务协议，由施工方承诺对完成后的项目履行保修义务承担保修责任。管理项目的保修范围和保修期限不低于政府有关部门规定的标准。保修责任由施工单位和其他依法应当承担保修责任的主体承担，乙方仅负责协助签订和移交相关保修文件，

不对工程实体缺陷承担保修责任。

第八条 乙方协助甲方建立完整的项目建设档案，在项目完成后将工程档案及相关资料向甲方和有关部门移交（如有）。未经同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第九条 本合同项下所有甲方提供的和本项目实施过程中产生数据、信息、文件均归甲方所有，乙方具有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得使用或泄露给任何第三方，且保密义务不因本合同履行、终止或解除而无效。

七、违约责任

本合同双方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，除本合同另有约定外，任何一方未按本合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并向守约方承担本合同金额 20% 的违约金，若违约金不足以弥补守约方的损失，违约方应予以补足。

八、合同变更与解除

甲方与乙方协商一致，可以解除合同或签订补充协议进行变更。

有下列情形之一的，合同当事人可以解除合同：

- (1) 乙方将本合同约定的服务内容全部或部分转包给他人，甲方可以解除合同；
- (2) 乙方提供的服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定的要求的，甲方可以解除合同；
- (3) 甲方未按合同约定支付服务酬金，经乙方催告后，在 28 天内仍未支付的，乙方可以解除合同；
- (4) 因不可抗力致使合同无法履行；
- (5) 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

任何一方提出变更或解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。本合同解除后，本合同约定的有关结算、违约责任、争议解决方式的条款仍然有效。

九、通知及送达

各方之间的一切通知均为书面形式，以本合同约定的地址为对方送达地址，可由专人送达、邮寄方式、电子邮件方式传送。

甲方地址：北京市西城区北礼士路 12 号

电话：010-88391698 联系人：吕微

电子邮箱：/

乙方地址：北京市西城区旧鼓楼大街甲3号

电话：13520658720 联系人：程丽明

电子邮箱：826258298@qq.com

通知在下列日期视为送达：(1)专人递送的通知，在专人递送之交付日；(2)以邮寄方式发出的通知，在邮件收妥或收件方拒收当日；(3)以电子邮件方式发出的通知，则以通知到达接收方接收系统之日。

各方确认本合同提供的联系方式、送达地址准确、有效。各方同意该联系方式、送达地址适用于本协议约定的所有通知的送达及本协议产生纠纷后的仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的法律文书送达。任何一方的联系方式、联系地址变更应及时通知其他方，否则应承担违约责任。

因一方提供或者确认的联系方式、送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知其他各方及法院、或指定的接收人拒绝签收等原因，导致根据本合同约定寄送的通知或法院寄送的法律文书未能被实际接收的，各方同意依下述方式处理：邮寄送达的，以邮件退回之日视为送达之日；直接当面递交送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；电子邮件方式送达的，通知发出当日为送达日期。

十、争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向项目所在地北京市西城区人民法院提起诉讼解决。

十一、本协议未尽事宜，双方以补充协议形式另行约定。

十二、本协议自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

本协议壹式陆份，双方各执叁份，各份具有同等法律效力。

(本页内，以下无正文)

(此页无正文)

甲方(公章): 北京市西城区城市管理委员会



法定代表人或委托代理人(签字):

王洪涛

通讯地址: 北京市西城区北礼士路12号

联系人: 吕微

联系电话: 010-88391698

签订日期: 2026年4月15日

乙方(公章): 北京天恒正宇投资发展有限公司



法定代表人或委托代理人(签字):

秦兴

通讯地址: 北京市西城区旧鼓楼大街甲3号


经办人: 程丽明

联系电话: 13520658720

签订日期: 2026年4月15日

1
2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

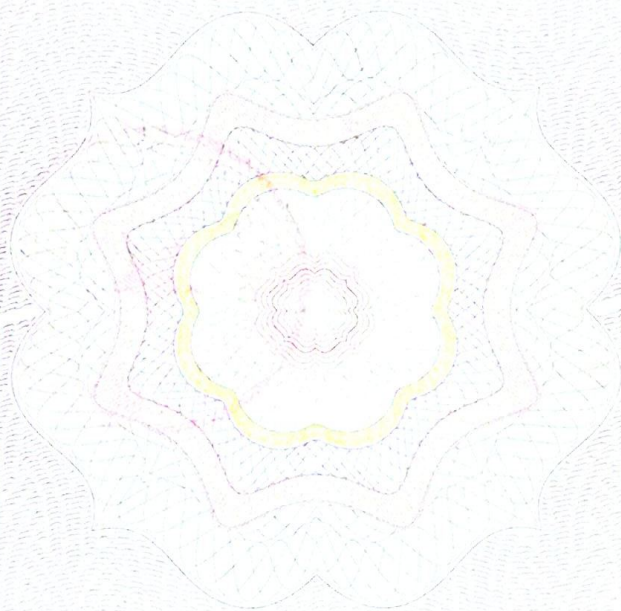

1
2
