

《事业支出其他建筑工程采购项目--北京
市昌平区医院 2026 年原疾控北楼、东楼
加固项目》施工合同

发包人：北京市昌平区医院

承包人：北京爱德伦建设集团有限公司

签约地点：北京市昌平区医院





北京市昌平区
Beijing Changping District H

《事业支出其他建筑工程采购项目--北京
市昌平区医院 2026 年原疾控北楼、东楼
加固项目》施工合同



北京市昌平区医院
Beijing Changping District Hospital

发包人：北京市昌平区医院

承包人：北京爱德伦建设集团有限公司

签约地点：北京市昌平区医院



北京市昌平区医院
Beijing Changping District H



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

北京市昌平区
Beijing Changping District

第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京市昌平区医院

法定代表人: 袁成

法定注册地址: 北京市昌平区鼓楼北街9号

承包人(全称): 北京爱德伦建设集团有限公司

法定代表人: 王子熠

法定注册地址: 北京市海淀区西三旗永泰园新地标14楼2707号

发包人为建设事业支出其他建筑工程采购项目—北京市昌平区医院 2026 年原疾控北楼、东楼加固项目(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 事业支出其他建筑工程采购项目—北京市昌平区医院 2026 年原疾控北楼、东楼加固项目

工程地点: 北京市昌平区医院

工程内容: 施工图纸范围内的土建结构加固工程等全部工作内容。
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: 11011426210200031442-XM001

资金来源: 自筹资金

二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的土建结构加固工程等全部工作内容。
详细承包范围见本工程“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2026 年 05 月 20 日

计划竣工日期: 2026 年 08 月 02 日

工期总日历天数 75 天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、施工现场安全生产标准化目标等级要求

施工现场安全生产标准化目标等级: 达标

六、合同形式



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（含税）（大写）：贰佰陆拾捌万伍仟壹佰叁拾陆元捌角肆分（人民币）

（小写）¥：2685136.84 元

[签约合同价（不含增值税）¥：2463428.29 元，增值税金额¥：221708.55 元]

其中：安全生产标准化措施费（含税）：216450.49 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：94716.89 元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）：30000.00 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

承包人收款信息：

户名：北京爱德伦建设集团有限公司

账号：11250501040017745

开户行：中国农业银行北京海淀东区分行

八、承包人项目经理：

姓名：汪辉本； 职称：高级工程师；

身份证号：51102719770922163X； 建造师执业资格证书号：△；

建造师注册证书号：京 1112014201636212。

建造师执业印章号：京 1112014201636212 (00)。

安全生产考核合格证书号：京建安 B(2004)0033221。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、合同清单；
- 9、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



昌平区医院


北京市昌平区
Beijing Changping District

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式四份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

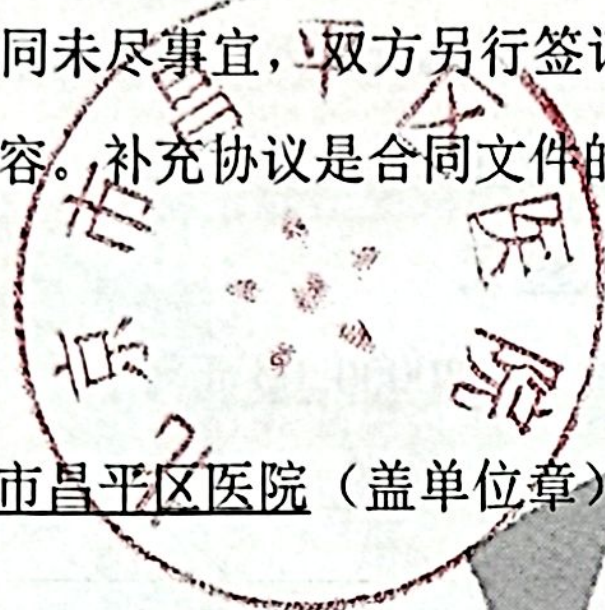

发包人：北京市昌平区医院（盖单位章）

承包人：北京爱德伦建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：



（签字）

法定代表人或其

委托代理人：

（签字）

2026 年 6 月 2 日

2026 年 6 月 2 日

签约地点：北京市昌平区



昌平区医院

北京市昌平区医院
Beijing Changping District Hospital



北京市昌平区
Beijing Changping District



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市昌平区医院

1.1.2.3 承包人：北京爱德伦建设集团有限公司

1.1.2.6 监理人：/

1.1.2.8 发包人代表：

姓 名：董辉

职 称：科长

联系电话：010-69742328-50301

电子信箱：/

通信地址：北京市昌平区鼓楼北街9号昌平区医院基建科

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：/

1.1.3.3 临时工程：包括临时性道路、水、电工程等

1.1.3.10 永久占地：/

1.1.3.11 临时占地：/

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：24月

1.1.4.6 基准日期：投标截止时间前 28 天的日期

1.1.8 其他需要补充的内容

1.1.8.5 其他需要补充的内容：/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 合同协议书；





北京市昌平区
Beijing Changping District

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 合同条款专用部分;
- (5) 合同条款通用部分;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 合同清单;
- (9) 其他合同文件。

(说明: (6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、合同清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件: 双方签字并盖章完成后

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限: 合同签订后 7 日内

发包人提供图纸的数量: 4 套

其他约定: /

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围: 本项目范围之内为完成本工程所需的、国家及地方法规所要求的、相关主管部门及行业规定、本合同其他项下所约定的全部文件。包括但不限于施工组织设计, 施工细部做法节点说明书, 总进度计划, 分阶段进度计划, 独立承包人进场时间计划, 发包人/监理人要求提交专项报告、施工周/月/年施工报告, 签署完整的工程设计变更和洽商单, 材料设备采购计划及相关文件等, 单项工程验收单、结算资料等。

承包人提供文件的期限: 在发包人要求的时间内


承包人提供文件的数量: 3 份

监理人批复承包人提供文件的期限: /

其他约定: /



北京市昌平区
Beijing Changping District



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点: 北京市昌平区鼓楼北街9号昌平区医院基建科

发包人指定的接收人为: 董辉

(3) 监理人指定的接收地点: /

监理人指定的接收人为: /

(4) 承包人指定的接收地点: 施工现场

1.13 工程量清单缺陷引起的价格调整 (适用于采用单价合同形式)

因工程量清单缺陷引起的价格调整办法:

(1) 以项计价的分部分项工程清单项目不应重新计量及调整。

(2) 依据建设工程工程量清单计价标准 (GB/T50500-2024) 等相关规定执行。

1.13 暂定数量单价计价项目的价格调整 (适用于采用总价合同形式)

分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价项目的价格调整办法: /。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限: 发包人应当将具备施工条件的施工场地, 在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额: /

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务: /



北京市昌平区医院
Beijing Changping District Hospital



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

3. 监理人。(该项为一般条款, 监理具体工作实施由发包人主管科室基建科管理)

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力:

监理人在作出如下行为、指令或决定时, 应事先取得发包人的书面同意, 否则其行为或决定对发包人不具有约束力, 发包人不承担因此导致的任何后果和责任, 承包人对此无异议:


- (1) 发布开工令、整体或局部暂时停工或复工令;
- (2) 确定工期或决定延长工期、工程月进度计划及更高级别变化的变更审批权;
- (3) 审查批准设计的变更, 并发出实施变更的指示;
- (4) 同意或批准承包人提出的索赔(包括工期索赔和费用索赔)及有关暂列金额的使用;
- (5) 涉及责任事件的签认需要办理现场签证, 以及对材料、设备单位需要进行市场询价、定价的;
- (6) 对不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备命令承包人停止使用, 批准使用替代材料或设备;对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业, 命令承包人停工整改或返工;
- (7) 对核算后已标价工程量清单的批准;
- (8) 监理人要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员, 上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作;
- (9) 变更、增加合同价款;
- (10) 洽商变更的签订;
- (11) 批准承包人提出的涉及工程价款、样品批复、工期、结算等事项的报告等事宜;
- (12) 预付款、工程款拨付的批准权、进度请款单的确认、进度付款单的签字支付;
- (13) 工程验收报告的确认;
- (14) 批准承包人使用新材料、新产品、新工艺、新技术。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求: /



4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容： /

4.1.13 其他义务

(1) 安全生产标准化措施费由承包人统一管理，承包人对工程安全生产标准化负总责。承包人不按分包合同约定支付安全生产标准化措施费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11 / 1983-2022）相关要求的产品。

(4) 承包人应履行的其他义务：

1) 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任，按照建设行政主管部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏、标志等），如因承包人原因未履行条款中约定义务造成工程财产损失或人身损害的，由承包人承担责任和损失。

2) 乙方施工不得妨碍甲方的正常经营活动，不得占用急救通道与消防登高面，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

3) 施工现场清洁卫生的要求：承包人负责整体工程的清洁卫生，按照建设行政主管部门和相关部门的规定办理，竣工后工程交接前按照要求清理现场，所需费用由承包人承担。

4) 承包人应最大限度地减少对周边毗邻地区和公共区域的干扰。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额


发包人 不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 /

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 与通用条款 4.11 一致



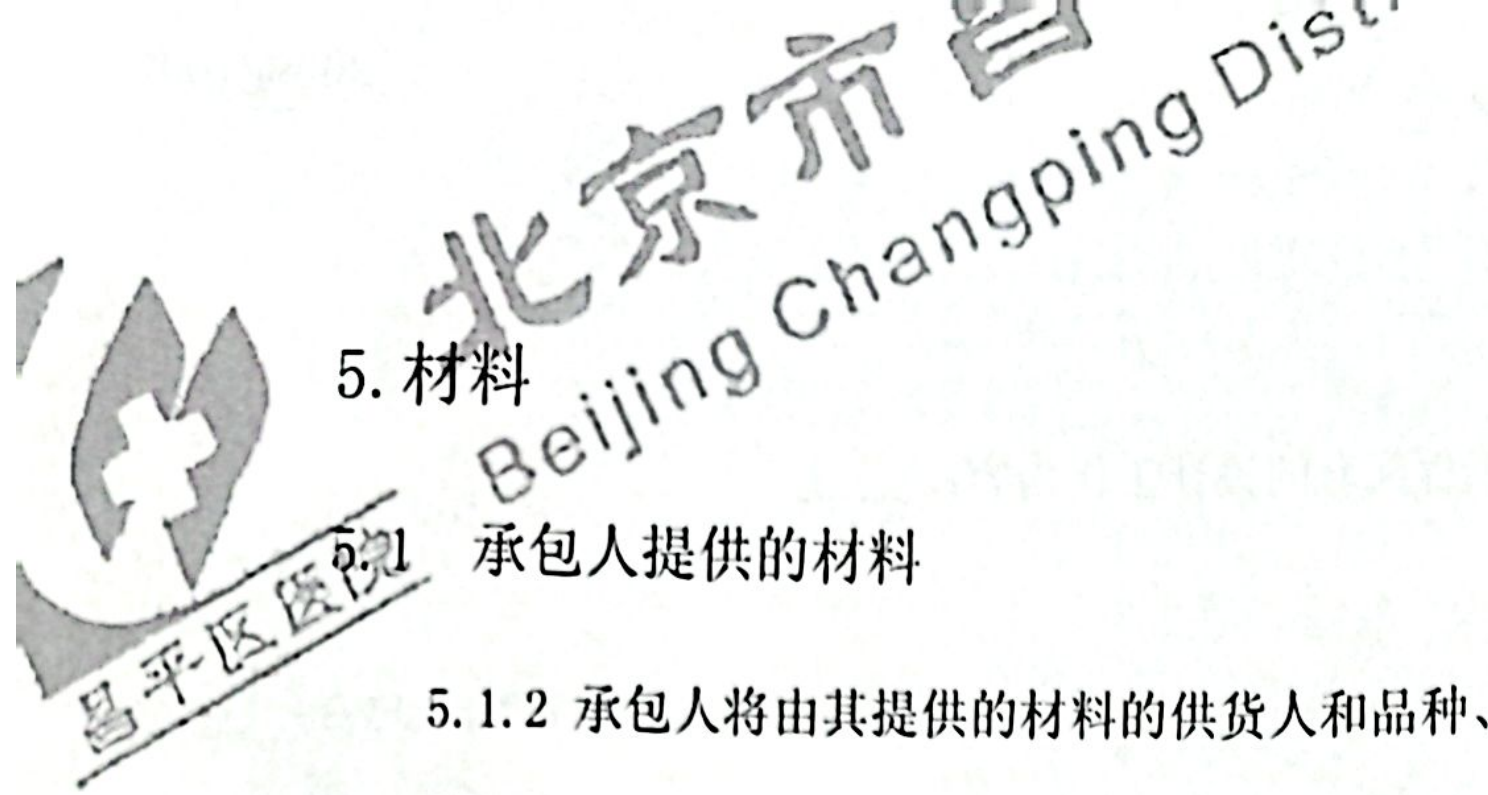

5. 材料

5.1 承包人提供的材料

5.1.2 承包人将由其提供的材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：采购前7天内

5.2 发包人提供的材料

5.2.7 因承包人原因引起发包人提供的材料的实际领用数量超过按图纸计算的实际数量（适用于采用单价合同形式）/按图纸计算的合理数量（适用于采用总价合同形式）及材料有效损耗时，超出部分的材料费用由承包人承担。

材料有效损耗=按上述约定计算的数量×“附件四：发包人提供的材料一览表”中对应的有效损耗率。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 天内

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：根据发包人要求
 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工通知后 7 天内

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：收到开工通知后 7 天内
 监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安保卫计划和突发治安事件应急预案的责任人：承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后 7 天内
 监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：合同价的 20%

9.6.2 发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/

9.7 特殊安全生产标准化

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者



计算方法：

9.7.2 发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：总进度计划关键线路目标，施工顺序和方法要点。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：在合同进度基础上编制分阶段和分项目的进度计划，施工方案中要说明施工组织顺序、施工人数（各工种的人数要分开）、施工机具种类和数量、保证工期的措施和方案

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：工程进度出现变化后7天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后7天内。

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求：

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求：

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因：由发包人原因造成的延误、干扰或阻碍等延



误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：50年一遇的特大降水降雨降雪、最高温度45℃

最低温度-30℃

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：逾期竣工违约金的计算标准：结算

价款的万分之二/天,逾期竣工违约金的计算方法：逾期天数×结算价款的万分之二/天,

其中：逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延长的工期。

逾期竣工违约金最高限额：不超过结算价款的20%

11.6 合同双方原因导致的工期延误

合同双方导致工期延误的原因：/

11.7 非合同双方原因导致的工期延误

非合同双方导致工期延误的原因：/

11.8 工期提前

提前竣工的奖励办法：/

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：/

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7天内

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到工程质量保证措施文件后7天内



13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前 24 小时内

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：质量检测相关文件真实、完整，按监理人或发包人要求格式报送

监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后 7 日内

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 24 小时内

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形：/

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内


(3) 监理人商定或确定变更价格的期限：发包人收到承包人变更报价书后的 14 天内

15.4 变更的估价原则

因变更引起的价格调整方法：按合同条款通用部分执行。

15.4.4 因变更引起措施项目发生变化的，措施项目费调整方法：如因变更引起措施项目发生变化，措施项目费相应据实调整。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起合同清单中列明的工程量发生增减，且单个项目工程量变化幅度在 15% 以内（含）时，应执行合同清单中列



明的该项目的单价；单个项目工程量变化幅度在15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过1%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该项目按修正后的新的单价计价。

15.4.7 因变更引起价格调整的其他处理方式： /

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法： /

15.7 计日工

15.7.1 计日工合同单价指：发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同清单中的计日工计价项目及其合同单价进行计算。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：

(4) 承包人报送招标计划期限： 7天

发包人审批招标工作计划时限： 7天

(5) 承包人报送相关文件时限： 7天

发包人审批相关文件时限： 7天

(10) 承包人申报合同文件时限： 7天

发包人审批合同文件时限： 7天

承包人报送正式签订合同副本时限： 7天

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为： 发包人 或者按照下列约定：

拟选三家单位比价选取

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法： 造价信息调整价格差额法

16.1.2 采用造价信息调整价格差额



16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：施工期内的预拌混凝土、钢材主要材料价格、人工费及机械费

引起价格调整的物价波动风险幅度：±5（不含）%

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2026年3月。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：发包人、承包人共同确认的市场价格为准

(3) 合同履行期间价格的确定方法：以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》施工期的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；

(4) 风险幅度的计算方法：/

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 价格调整方法：

采用算数平均法：以采购期内每月价格的平均值

16.1.2.4 其他约定：造价信息调整时价格，应参照北京市建设工程造价管理协会公布的价格信息

16.1.3 其他价格调整方法

/

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

本工程的计量周期：月

(1) 每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））

单价项目已完成工程量按月计量。

(3) 总价项目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工



量计量)

17.1.5 总价项目的计量 (适用于采用支付分解报告)

(1) 采用支付分解报告计量方式的, 总价项目的价格调整方法: /

17.1.5 总价项目的计量 (适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价项目的价格调整方法: 因非承包人原因引起已标价工程量清单中, 某总价子目工程量变化幅度超过 15% (含), 且该变化引起相关总价子目费用发生变化的, 承包人应针对总价子目的变化提交实施方案及价格调整报告, 由监理人或发包人核准确定需调整的项目价款。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度: 合同总价的 30% 。

其中: /

(2) 预付办法

预付款预付办法: 合同签订并备案 (如需要), 且材料、人员进场后, 承包人提交付款申请和相应款项合规发票后 15 日内, 发包人一次性向承包人支付预付款。承包人不提供合规发票的, 发包人有权相应顺延付款期限而无需承担违约责任。

预付款的支付时间: 本合同签订后, 不迟于本项目约定的开工日期前 7 天内, 但需满足上述预付办法约定的条件。

(3) 安全生产标准化措施费用预付额度及方式

随进度款支付。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法: 预付款在进度款中不扣回, 直接抵作工程款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 一式四份

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容:

(7) 根据合同应增加和 (或) 扣减的其他内容金额: 说明承包人认为自己在该付款周期内有权得到的款项, 同时提交包括进度款报告在内的任何必要的计算书、清单或其他证



明文件

(S) 本期应付进度款: _____

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准: 按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算

逾期付款违约金的计算方法: 逾期付款违约金=应付款金额*日利率*逾期天数

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方式: 本工程价款为固定单价, 最终结算以第三方审定金额为准。材料、人员进场, 经发包人确认无误后, 发包人按约定的预付款支付方式履行预付款支付。施工进度达 60%时, 经发包人确认无误后, 发包人支付合同总价款的 30%。工程完工验收合格承包人移交全部资料给发包人并经第三方审核后根据审核结果支付剩余的 37% (具体价格以审核结果为准, 支付至审核结果的 97%)。缺陷责任期满且承包人履行完毕修复义务后, 发包人支付审核结果 3% 的尾款 (即预留的质量保证金)。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式: 采用扣留质量保证金 (采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金)。

质量保证金约定比例: 3%

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程 不进行 (进行/不进行) 过程结算。


过程结算的相关要求: _____

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数: 一式四份

承包人提交竣工付款申请单的期限: 在工程接收证书颁发后 14 天内

(2) 竣工付款申请单的其他内容: 竣工结算报告、付款申请表、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程竣工验收单、工程移交接收单、北京市住建委出具的工程竣工备案完成通知单、档案馆出具的竣工资料接收回执。



17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 60 天内

发包人向承包人不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：在竣工验收前 30 个工作日内须向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的竣工资料及图纸

竣工验收资料的份数：3 份，电子版 2 份

竣工验收资料的费用支付方式：承包人向发包人提交的全部竣工资料的费用已包含在合同总价中，承包人不再另行收取任何费用。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：根据发包人、监理人要求确定

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：缺陷责任期满 28 天内。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：/

18.9.2 验收不合格的，承包人在24 小时期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：详见附件质量保修书，若国家、北京市对工程保修范围的标准要求更高的，按更高标准执行



北京市昌平区医院 Beijing Changping District Hospital

工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、法规的强制规定

定

工程质量保修责任：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用由承包人承担。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。③质量保修完成后，由发包人组织验收。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保 (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：

(1) 投保人：/

(2) 投保内容：/

(3) 保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额：/

(5) 保险期限：/

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由/承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料等办理的保险：/

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：/



21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形: /

不可抗力的等级范围约定: /

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 合同双方友好协商不成、不愿提请争议组
评审或者不愿接受争议评审组意见的, 选择下列第 贰 种方式解决:

 (壹) 提请 / 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对合同
双方均有约束力。

 (贰) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。



北京市昌平区医院
Beijing Changping District Hospital




北京市昌平区医院
Beijing Changping District Hospital



承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构	层数	跨度 (米)	设备安装内容	工程造价 (元)	开工日期	竣工日期
原疾控北楼	/	2496	砖混	4	54.58	/	详见响应文件	2026.5.20	2026.8.2
原疾控东楼	/	930	砖混	4	19.2	/	详见响应文件	2026.5.20	2026.8.2



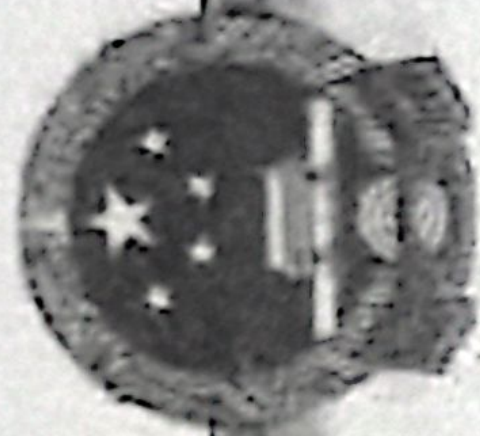


营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108759633495L



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称

北京爱德建设集团有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

王宇翔

经营范围

许可项目：建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 5000 万元

成立日期 2004 年 02 月 27 日

住所 北京市海淀区西三环水磨园新地标 11 楼 2707 号

登记机关



2024 年 08 月 07 日



扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App
